



**Gigante
Salmon**

KVARTALSRAPPORT

FJERDE KVARTAL

2022

INNHold

3	Hovedpunkter
4	Anlegget
6	Prosjektgjennomføring
8	Operasjonell gjennomgang
10	Finansiell gjennomgang
13	Uttalelse fra styret og adm.dir.
14	Kvartalsrapport 4. kvartal 2022
18	Noter

Hovedpunkter

4. KVARTAL 2022

- Grunnarbeidene har pågått gjennom hele perioden, og er nå ferdige for produksjonsbasseng 3. Sprengningsarbeider for hele anlegget vil være ferdig i løpet av februar 2023.
- Gjennomførte anskaffelser og inngåtte avtaler: Skretting, Xylem, Infrakon.
- Søknadsprosess for etablering av mindre sjøfylling for plassering av inntaksrør vest av Lille Indre Rosøy.
- Vår smoltpartner Grytåga Settefisk AS, har startet produksjonen av den første fisken som skal settes ut i anlegget vårt.

Hendelser etter balansedato:

- Signert avtale med Lovund Bedrifts Service AS for levering av betong.
- Signert avtale med Nordkontakt og Elektro AS for en totalløsning på elektro, automasjon, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon.
- Innvilget tillatelse for etablering av sjøfylling for plassering av inntaksrør.
- Ansettelse: Bjørn Arne Johansen er ansatt som tekniker, og starter den 01.05.2023.




Helge E. W. Albertsen
Daglig leder



Oppdrettsanlegget vårt bygges for å gi fisken de beste forholdene for trivsel og tilvekst i hele produksjonfasen. Dette gjør vi med kontinuerlig utskifting av friskt sjøvann, og en fysisk utforming som gir rikelig med motstrøm for laksen å svømme i.

Hvert av de tre produksjonsbassengene våre er fysisk adskilte, og kan defineres som egne smittesoner. Det blir installert en sluse mellom produksjonsbassengene, blant annet for å ivareta biosikkerheten. Hver produksjonsenhet skal også brakklegges 1 måned mellom hvert utsett, for å utføre vedlikehold, vasking og desinfisering.

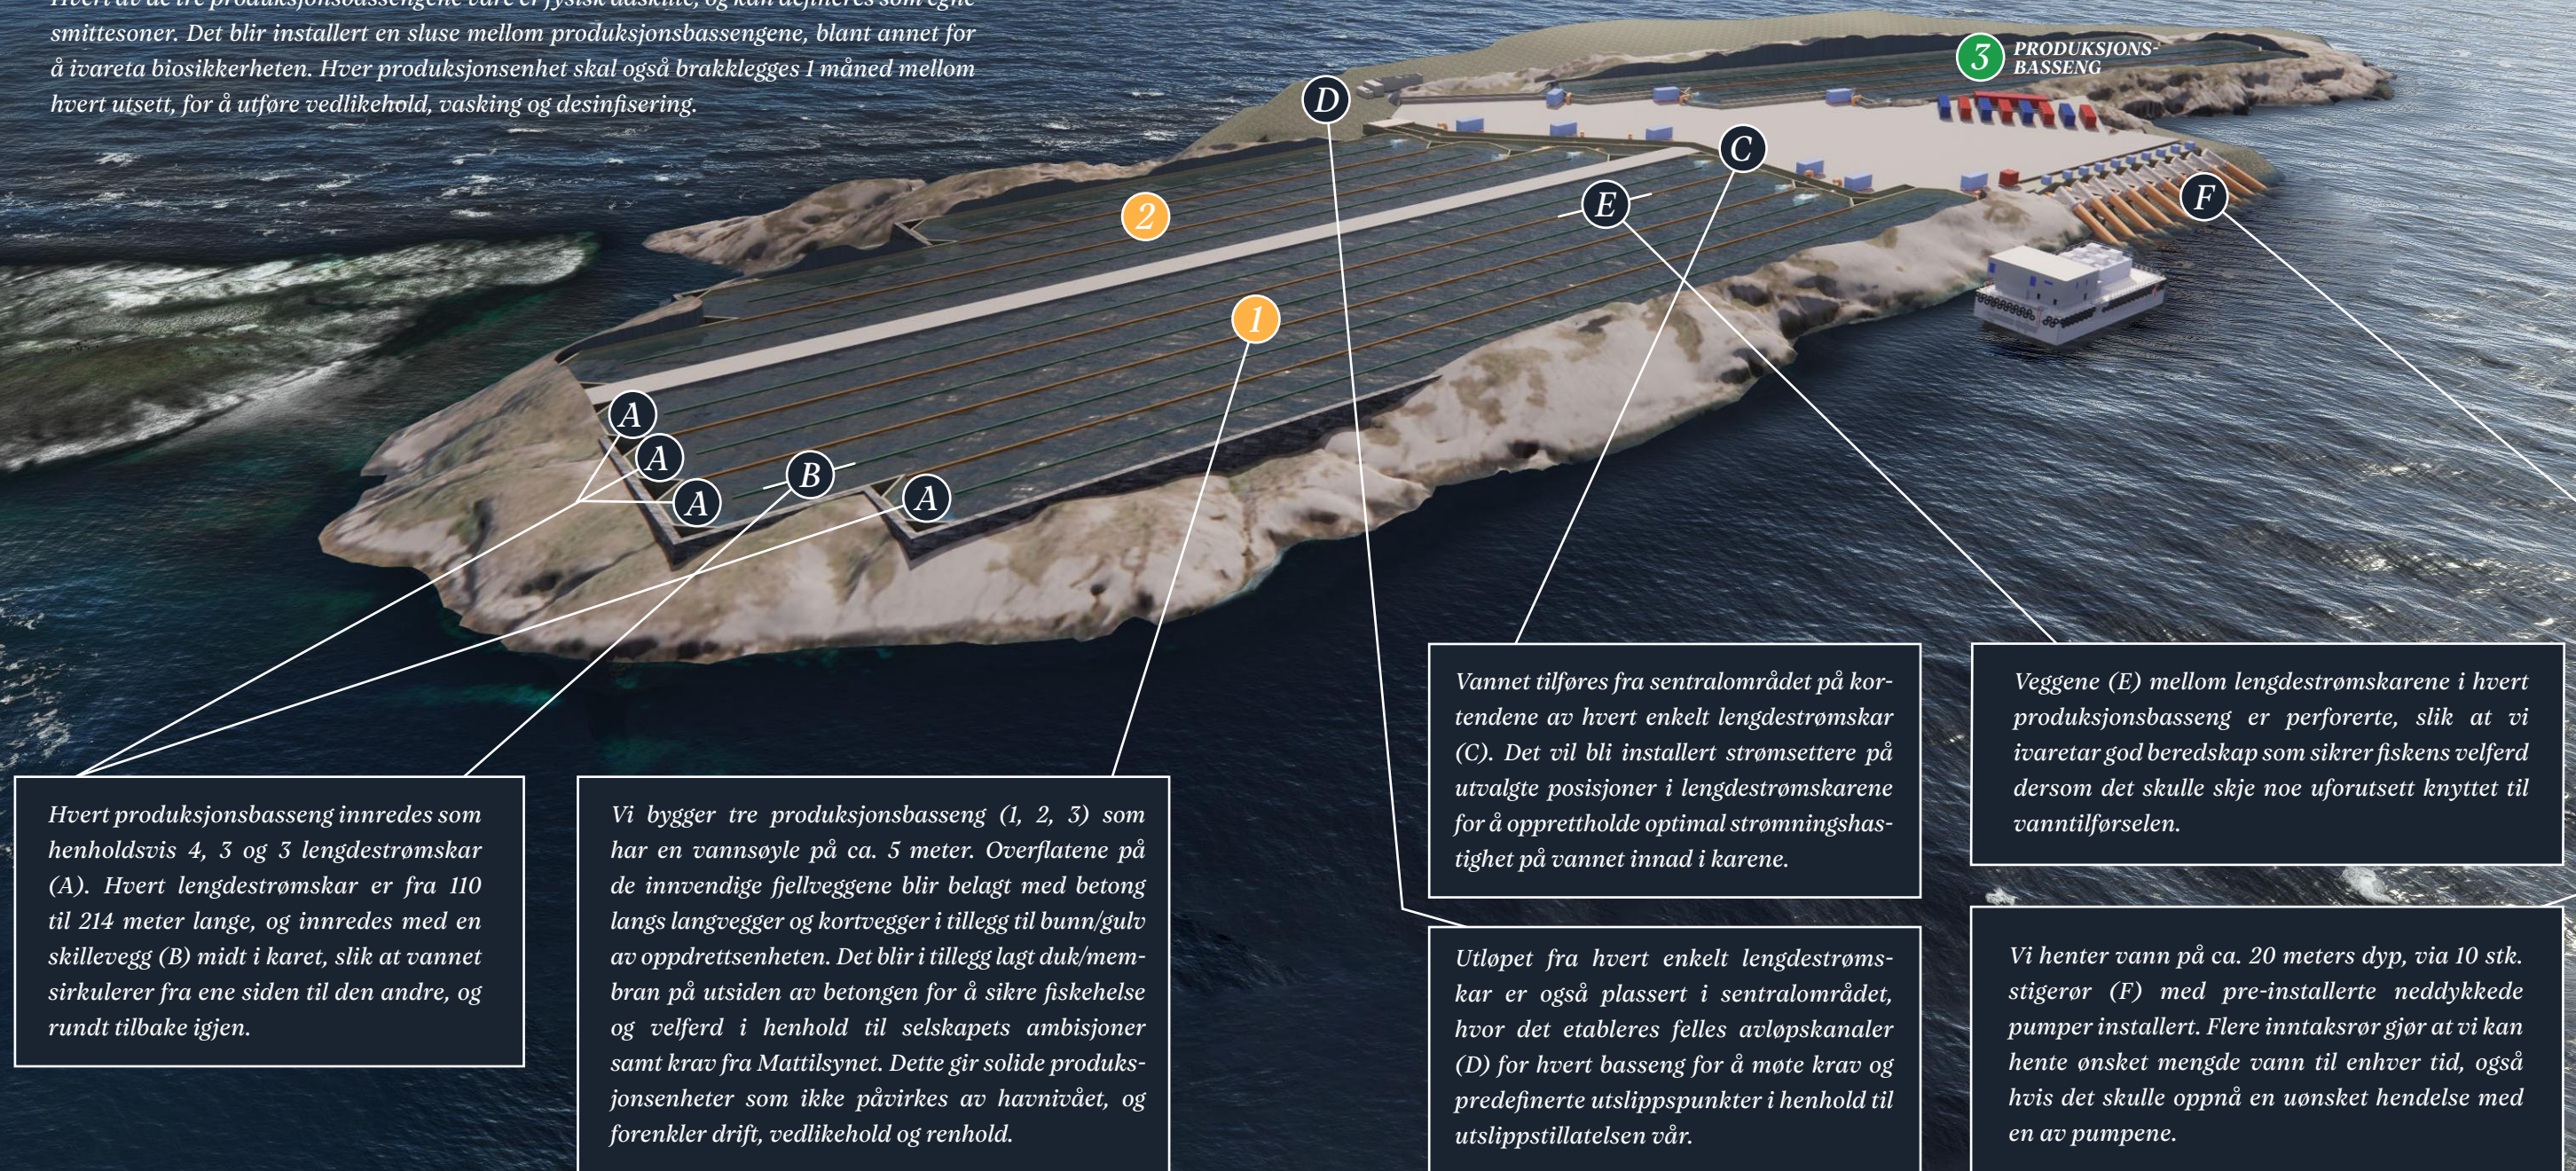

Prosjektgjennomføring

Framdriften i prosjektet går i henhold til vedtatte planer.

Gjennom 4. kvartal er det inngått viktige avtaler med forleverandør (Skretting), Xylem (innløpspumper) og Infrakon, som skal utføre betongarbeidene i produksjonsbassengene.

Detaljprosjektering av løsningene, og forberedelse for gjennomføring er i all hovedsak ferdigstilt gjennom perioden.

Som tidligere rapportert er opp-dretnsnæringen, herunder Gigante Salmon Rødøy, berørt av betydelige kostnadsøkninger og utfordrende leveringstider innenfor fagfeltet el-kraft. Det pågår fremdeles detaljprosjektering for el-kraft, både elektro og automasjon, samt mot nettleverandør av strøm, med mål om å identifisere kostnadsreduerende tiltak uten at det påvirker ambisjoner på fiskehelse og -velferd.

Vi har besluttet at samtlige vegger og gulv skal dekkles med betong, i tillegg til at det installeres PE-liner eller membran mot alle vannberørte overflater. Dette gir bedre fiskehelse og velferd. Vi oppnår også en sikrere nivåregulering av vannstanden mellom lengdestrømskarene under drift, og ved hendelser som kan medføre stans i vannforsyningene fra en eller flere pumper.

Løsningen medfører økte kostnader, da dette ikke var inkludert i opprinnelig arbeidsomfang og bud-

sjett. Foreløpig gjelder denne beslutningen kun produksjonsbasseng 3. Om denne løsningen skal videreføres også for produksjonsbassengene 1 og 2 vurderes etter at produksjonen i basseng 3 er startet.

Det er fortsatt markedsmessige utfordringer etter pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. Utfordringene har gitt økte utstys- og materialpriser, og lengre leveringstider. Vi har inngått avtaler for leveranser av kritisk utstyr som skal være på plass før oppstart. Prosjektleveranser kan fortsatt påvirkes, og vi har etablert en plan for installasjon, ferdigstillelse og oppstart som tar høyde for denne risikoen.

I tillegg vil grunnarbeidene i produksjonsbassengene 1 og 2 være ferdig med en stor del felles infrastruktur, (flåte, slamanlegg, m.m.) Dette gir oss erfaringer på teknologiske valg og tilhørende kostnader som vil være verdifulle for ferdigstilling av de to øvrige produksjonsbassengene mot sommeren

2024. Etter at produksjonsbasseng 3 er ferdig vil vi presentere en oppdatert investeringsprognose, men jobber fortsatt innenfor rammene i vedtatt budsjett.

I tråd med framdriftsplan er det kun produksjonsbasseng 3 som skal være klart til oppstart høsten 2023.

Grunnarbeidet i enheten som startes først, produksjonsbasseng 3, er nå ferdig. Installasjonsarbeidet starter 1. kvartal 2023, og vil pågå fram til midten av juli 2023.

Prosjektet arbeider med de siste detaljprosjekteringene, som sikrer et grundig og kvalitetssikret dokumentasjonsgrunnlag for gjennomføring, installasjon, ferdigstillelse og oppstart. Alt detaljprosjekteringsarbeid er ventet ferdigstilt i løpet av Q1 2023.

Prosjektet følger framdriftsplanen mot oppstart av første produksjonsenhet september 2023.



Operasjonell gjennomgang

Bassenget hvor produksjonen starter i september 2023 er nå ferdig sprengt og tømt for løsmasser.

Videre arbeid med betongleveranser og betongarbeider begynner i februar, og vil pågå til medio august med siste milepæl for ferdigstilling av avløpskanaler. Øvrige aktiviteter og arbeid med basseng 3 vil gå parallelt, herunder installasjon av pæler, elektro, automasjon, gangbaner m.m.

Hovedarbeidet med å etablere steinfylling i sjøen nordøst av Lille Indre Rosøy har pågått gjennom hele perioden, og forventes ferdig 1. kvartal 2023.

Det er besluttet å ikke bygge kai sørøst på Lille Indre Rosøy, som opprinnelig inntegnet. Det er ikke behov for en dedikert kai, og prisen for kai samsvarer ikke med budsjettert kostnad.

Det ble derfor omsøkt en mindre steinfylling på nordøstsiden av Lille Indre Rosøy i Q4, som del av infrastrukturen for inntaksrør/stigerør. Søknaden er innvilget hos Statsforvalteren i Nordland etter balansedato. Arbeidet med denne vil starte medio februar, etter at det foreligger en IG-tillatelse.

Det er gjort en ansettelse gjennom perioden: Elektriker Anders Larsos er ansatt i Gigante Salmon Rødøy AS, og starter 1. april.



Endelig energiløsning, herunder ilandføring av sjøkabel ble avklart i Q4 2022. Denne leveransen er todelt, med første delleveranse ferdig for oppstart i september 2023. Leveransen for første del blir en kombinert land/sjøkabel fra Rødøy til Rosøy, for uttak av tilgjengelig strøm i Rødøy-nettet, ca. 1 MW, for første produksjonsfase. Deretter fortsetter delleveranse 2, som inkluderer en lengre sjøkabel fra Reppen-Rødøy for å forberede og ivareta produksjonsfase 2 (fra 2025).

Installasjonsfasen starter i februar 2023. Lovund Bedrifts Service ivaretar betongleveransen, og Infrakon er utførende på betongarbeider. Det pågår løpende planlegging for mot-tak av utstyr og leveranser, herunder inntaksrør, pumper o.l. for å sikre optimal logistikk. Det er inngått avtale om leie av ekstra boenheter på Rødøy for innkvartering av personell utover de plassene som er tilgjengelig på anleggsområdet.

Finansiell gjennomgang

RESULTAT FOR 4. KVARTAL 2022

Da konsernet fortsatt er i en utbyggingsfase, ble salgsinntektene i fjerde kvartal tilsvarende fjoråret på 0 MNOK. Driftskostnadene ble i fjerde kvartal 1,2 MNOK, opp fra 0,6 MNOK i 2022, som følge av økt aktivitet i konsernet. Driftsresultatet i perioden ble -1,2 MNOK.

Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på -1,4 MNOK. Differansen fra driftsresultatet skyldes i hovedsak endring i tidsavgrensningsposter. De samlede investeringene i konsernet i fjerde kvartal var 15,0 MNOK, hvorav 9,0 MNOK av investeringen er knyttet til konsernets utbyggingsprosjekt i Rødøy og resterende knyttet til økt fordringsmengde

Kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2022 100 % av samlet gjeld i konsernet, tilsvarende som pr. 31.12.2021. Langsiktig bankfinansiering for utbyggingen i Gigante Salmon Rødøy er innvilget, men ikke åpnet. Dette er langsiktig finansiering fra Sparebanken Nord-Norge, og vi forventer å åpne byggelånet mot slutten av første kvartal 2023. Konsernets finansielle stilling er god, og pr. 31.12.2022 kan konsernet nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest likvide midlene.



Konsernets likviditetsbeholdning var 182,1 MNOK per 31.12.2022. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer vurderes som god.

Totalkapitalen var ved utgangen av fjerde kvartal 2022 317,4 MNOK, sammenlignet med 290,7 MNOK året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2022 var 88 %, sammenlignet med 94 % pr. 31.12.2021.

Fullstendig resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter på etterfølgende sider.





Uttalelse fra styret og daglig leder

Styret og administrerende direktør bekrefter at det konsoliderte regnskapet for perioden 01.01.22-31.12.22 er utarbeidet i henhold til god norsk regnskapsskikk, og gir et korrekt bilde på selskapets eiendeler, forpliktelser, finansielle status, inntekter og kostnader som helhet. Vi bekrefter også at kvartalsrapporten inkluderer en rettvise oppsummering av selskapets viktigste hendelser frem til resultatfremleggelsen.


Bodø
13. februar 2023




Eirik Sørgeard
Styreleder




Helge E. W. Albertsen
Daglig leder



Kristin Ingebrigtsen
Styremedlem



Liv Monica Stubholt
Styremedlem



Kjell Lorentsen
Styremedlem

Kvartalsrapport 4. kvartal 2022

Resultatregnskap

(Beløp i kNOK)

Konsern					
Resultatregnskap	Note	4. kv. 2022	4. kv. 2021	2022	2021
Annen driftsinntekt		23	1902	152	1902
Sum driftsinntekter		23	1902	152	1902
Lønnskostnad		-	851	360	2129
Avskrivning	1	25	24	96	32
Andre driftskostnader		1170	-308	3408	1548
Sum driftskostnad		1194	568	3864	3709
Driftsresultat		-1171	1335	-3713	-1806
Andre renteinntekter		1629	606	4662	848
Annen finansinntekt		-	0	-	0
Andre rentekostnader		-	-93	29	0
Annen finanskostnad		2	0	4	0
Netto finans		1627	699	4629	848
Resultat før skattekostnad		456	2034	916	-958
Skattekostnad	4	-53	354	-4667	-3698
Periodens resultat	2	509	1680	5583	2739
Herv til minoritetsinteresser		-	-	-	-
Periodens resultat til majoritetsinteressene		509	1680	5583	2739
Disponering					
Overført til/fra egenkapital		509	1680	5583	2739

Kontantstrømoppstilling

(Beløp i kNOK)

Konsern				
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	4. kv. 2022	4. kv. 2021	2022	2021
Resultat før skattekostnad	456	2034	916	-958
Periodens betalte skatt	0	0	2429	0
Avskrivninger	25	24	96	32
Endring i kundefordringer	-336	0	1413	0
Fradrag tilbakegående mva-oppgjør	0	43	0	28
Endring i leverandørgjeld	190	87	58	1518
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1741	-3364	-12152	-2463
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-1406	-1175	-7238	-1844
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-9023	-422	-69369	-5733
Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs)	-5990	0	0	0
Innbetalinger på andre lånefordringer (korts.)	0	616	0	-3678
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-15013	194	-69369	-9411
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter				
Innbetaling av egenkapital	0	0	0	222000
Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (langs.)	0	-1705	0	-1705
Emisjonskostnader ført direkte mot egenkapital	0	-480	0	-15902
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0	-2185	0	204393
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter				
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	-16419	-3166	-76607	193138
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	198516	261870	258704	65566
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	182097	258704	182097	258704
Denne består av:				
Bankinnskudd m.v.	182097	258704	182097	258704

Balanse

(Beløp i kNOK)

Konsern					
Eiendeler	Note	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill		0	0	0	43
Utsatt skattefordel	4	6 078	6 025	3 841	4 194
Sum immaterielle eiendeler		6 078	6 025	3 841	4 237
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		108 807	65 327	20 509	4 006
Skip		776	798	865	888
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		24	12	16	18
Sum varige driftsmidler	1	109 606	66 137	21 390	4 911
Sum anleggsmidler		115 684	72 162	25 231	9 149
Kundefordringer		350	63	0	0
Andre fordringer		19 285	15 995	6 782	3 695
Sum fordringer		19 635	16 058	6 782	3 695
Bankinnskudd, kontanter o.l.		182 097	198 516	258 704	261 870
Sum omløpsmidler		201 733	214 574	265 486	265 565
Sum eiendeler		317 417	286 736	290 716	274 713

Balanse

(Beløp i kNOK)

Konsern					
Egenkapital og gjeld	Note	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Aksjekapital	3	105 556	105 556	105 556	105 556
Overkurs		165 734	165 734	165 734	166 214
Annen innskutt egenkapital		114	114	114	-968
Sum innskutt egenkapital	2	271 404	271 404	271 404	270 802
Annen egenkapital		8 125	7 616	2 716	1 673
Sum opptjent egenkapital	2	8 125	7 616	2 716	1 673
Minoritetsinteresser		0	0	0	0
Sum egenkapital	2	279 529	279 020	274 120	272 475
Øvrig langsiktig gjeld		0	0	0	1 763
Sum annen langsiktig gjeld		0	0	0	1 763
Leverandørgjeld		37 069	2 201	15 932	208
Skyldige offentlige avgifter		189	280	280	122
Annen kortsiktig gjeld		630	5 235	384	145
Sum kortsiktig gjeld		37 888	7 716	16 596	475
Sum gjeld		37 888	7 716	16 596	2 238
Sum egenkapital og gjeld		317 417	286 736	290 716	274 713

Noter

Kvartalsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder standard for delårsregnskap (NRS 11). Alle vesentlige regnskapsprinsipper og beregningsmetoder benyttet i det siste årsregnskapet er beskrevet i konsernets årsrapport for 2021.

Årsrapporten er publisert på www.gigantesalmon.no. For en fullstendig redegjørelse av benyttede regnskapsprinsipp vises det til denne.

NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Skip	Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	Sum
Anskaffelseskost 30.09.22	65 327	895	18	66 240
Akkumulerte avskrivninger 30.09.22	0	97	7	104
Balanseført verdi 30.09.22	65 327	798	12	66 137
Tilgang*	43 480	0	15	43 495
Anskaffelseskost 31.12.22	108 807	895	33	109 735
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	0	119	9	128
Balanseført verdi 31.12.22	108 807	776	24	109 606
Avskrivninger i 4. kv. 2022	0	22	2	25

Konsernet eier to øyer som ikke avskrives.

Gigante Salmon er i byggefase for sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Dette forklarer de nye aktiveringene på varige driftsmidler.

Byggingen er iht. investeringsbudsjett og tidsramme. Byggeperioden varer til august 2023 med første utsett av smolt september 2023.

*Det er aktivert eget arbeid med kNOK 863.

ENDRING I AVSKRIVNINGSPLAN

Det er ingen endringer i avskrivningsplaner.

NOTE 2 - EGENKAPITAL

Periodens endring i egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen oppjent egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.22	105 556 037	165 734 431	113 935	2 715 562	274 119 965
Resultat 1. kvartal	0	0	0	-619 065	-619 065
Egenkapital 31.03.22	105 556 037	165 734 431	113 935	2 096 497	273 500 900
Resultat 2. kvartal	0	0	0	-111 475	-111 475
Egenkapital 30.06.22	105 556 037	165 734 431	113 935	1 985 022	273 389 424
Resultat 3. kvartal	0	0	0	5 630 503	5 630 503
Egenkapital 30.09.22	105 556 037	165 734 431	113 935	7 615 525	279 019 925
Resultat 4. kvartal	0	0	0	509	509
Egenkapital 31.12.22	105 556	165 734	114	8 125	279 529

NOTE 3 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen utgjør kNOK 10 556 og består av 105 556 037 aksjer med pålydende kr 1 pr aksje.

OVERSIKT OVER DE 20 STØRSTE AKSJONÆRENE PER 31.12.22.

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Gigante Havbruk AS	64 238 000	60,86 %
T Kolstad Eiendom AS	7 272 728	6,89 %
J.P. Morgan AS	2 748 631	2,60 %
Helgeland Invest AS	2 727 272	2,58 %
Torghatten Aqua AS	2 727 272	2,58 %
Ravi Investering AS	1 970 125	1,87 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	1 832 428	1,74 %
Olav Olsen Holding AS	1 500 000	1,42 %
IHA Invest AS	1 455 000	1,38 %
Commuter 2 AS	1 090 909	1,03 %
Yannick AS	1 040 000	0,99 %
LIMIT AS	910 000	0,86 %
DNOR AS	909 093	0,86 %
Nyhamn AS	909 091	0,86 %
UBS Switzerland Ag	683 485	0,65 %
Oxvold Invest AS	600 000	0,57 %
Aino Aktiv AS	574 255	0,54 %
Joe Invest AS	561 739	0,53 %
Maria Olaisen AS	545 455	0,52 %
Hausta Vekst AS	545 454	0,52 %
Occasione By Olaisen AS	545 454	0,52 %
Øvrige	10 169 646	9,63 %
Sum	105 556 037	100,0 %

AKSJER EID AV LEDELSE OG NÆRSTÅENDE TIL DISSE

Navn	Rolle	Antall aksjer	Eierandel
Helge E. W. Albertsen	CEO	200 000	0,19 %
Rune Johansen	CFO	310 000	0,29 %
Linda Storholm	CCO	15 500	0,01 %
Eirik Sørgård	Styreleder	200 000	0,19 %
Kristin Ingebrigtsen	Styremedlem	15 000	0,01 %

Eirik Sørgårds 200 000 aksjer eies via sitt heleide selskap Pronord AS.

Rune Johansens 310 000 aksjer eies 35 000 på privat hånd og 275 000 via sitt heleide selskap Nord-Norsk Eiendom AS.

Kjell Lorentsen har bestemmende innflytelse gjennom Gigante Havbruk AS som eier 64 238 000 aksjer (eierandel 60,86 %).

NOTE 4 - SKATT

BEREGNING AV UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL				
Midlertidige forskjeller	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Netto midlertidige forskjeller	6 629	5 699	3 271	2 068
Underskudd til fremføring	-34 257	-33 085	-20 729	-21 133
Grunnlag for utsatt skattefordel	-27 628	-27 386	-17 458	-19 065
Utsatt skattefordel	-6 078	-6 025	-3 841	-4 194
Utsatt skattefordel i balansen	-6 078	-6 025	-3 841	-4 194

GRUNNLAG FOR SKATTEKOSTNAD, ENDRING I UTSATT SKATT OG BETALBAR SKATT				
Grunnlag for betalbar skatt				
Resultat før skattekostnad	456	917	-958	-1 493
Permanente forskjeller	29	-202	-15 849	-15 422
Grunnlag for skattekostnad på periodens resultat	485	716	-16 808	-16 916
Endring i midlertidige forskjeller	-930	-810	-3 271	-828
Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet	-444	-94	-20 079	-17 744
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	-444	-94	-20 079	-17 744

Fordeling av skattekostnaden	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Betalbar skatt	0	0	0	0
Sum betalbar skatt	0	0	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel*	0	-2 284	-3 698	-3 721
Tilbakebetalt skatt 2013/2014*	-53	-2 429	0	0
Skattekostnad	-53	-4 713	-3 698	-3 721

*Selskapet fikk i 3. kv. medhold i en skatteklage som medfører en positiv resultateffekt på kNOK 4 713.

NOTE 5 - OVERSIKT NÆRSTÅENDE PARTER OG TILKNYTNINGER

Nærstående part		Tilknytning
a)	Gigante Havbruk AS	Eier Gigante Salmon 61%
b)	KapNord AS	Gigante Havbruk eier 51%
c)	Polarplast AS	Gigante Havbruk eier 40%
d)	Gildeskål Forskningsstasjon AS	Gigante Havbruk eier 100%
e)	Salten Aqua AS	Gigante Havbruk eier 35%
f)	Salmon Center AS	Gigante Havbruk eier 100%
g)	Fish Farm International AS	Eies 100% av Gigante Havbruk AS
h)	Gigante Havbruk AS	Eier Gigante Salmon 61%

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER		
Beløp		Gjelder
a)	197	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS oppdrettsanlegg
b)	98	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS oppdrettsanlegg
c)	253	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS oppdrettsanlegg
d)	574	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS oppdrettsanlegg og leie av arbeidsbåt
e)	331	Kjøp av administrasjonstjenester
f)	40	Kontorleie - Bodø
g)	1 275	Leie av anleggsferje (MF "Haarek")
h)	23	Inntekter for kommunikasjonstjenester til Gigante Havbruk-konsernet

Detaljprosjektering er aktivert på linjen Tomter, bygninger o.a. fast eiendom.



**Gigante
Salmon**
