



**Gigante
Salmon**

KVARTALSRAPPORT

TREDJE KVARTAL

2023

INNHold

3	Hovedpunkter
4	Oppdatert prosjektsammendrag Rødøy
6	Prosjektgjennomføring
8	Operasjonell gjennomgang
10	Finansiell gjennomgang
13	Uttalelse fra styret og adm. dir.

14	Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 <i>Gigante Salmon - Konsern</i>
18	Noter
22	Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 <i>Gigante Salmon AS</i>
26	Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 <i>Gigante Salmon Rødøy AS</i>

Foto: Gigante Salmon

Hovedpunkter

3. KVARTAL 2023

- Landstrøm for fase I er etablert
- Før-, bolig- og arbeidsflåten er forankret og operativ
- Stigerør og silkasser for vanninntak fase I er installert
- Gjennomført forberedelse, tilrettelegging og installasjoner i teknisk område for fase I
- Samtlige posisjoner i planlagt driftsorganisasjon er besatt
- Gjennomført planrevisjon og oppdatert prognose

HENDELSER ETTER BALANSEDATO:

- Kapitalinnhenting – Avtale om delfinansiering ved leasing er inngått med Sparebank1 Finans Nord-Norge
- Kapitalinnhenting - Rettet emisjon gjennomført 11. oktober, fulltegnet med bruttoproveny 200 MNOK



Helge E. W. Albertsen
Adm. Dir.



Oppdatert prosjektsammendrag Rødøy

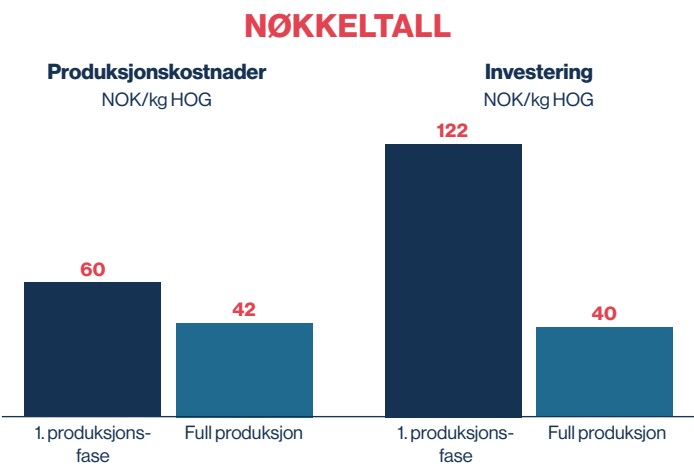
Gigante Salmon bygger oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Kapasiteten i anlegget er en årlig produksjon på opp mot 16.000 tonn sløyd laks, med utgangspunkt i en produksjonstillatelse på 13.731 MTB (maksimalt tillatt biomasse).

Utbyggingen og oppbyggingen av produksjonen er delt inn i 2 faser. I første fase gjennomføres grunnarbeider, etablering av infrastruktur og ferdigstilling av produksjonsbasseng 3, hvor det settes ut smolt i Q4 2023.

I parallell med produksjonen i produksjonsbasseng 3 vil de to andre produksjonsbassengene ferdigstilles og produksjonen i disse startes medio 2024.

Det er gjort designendringer på vegger og gulv, med betong dekket av liner, samt betong i avløpskanalene. Etablert sjøfylling gir økt areal. Økt nivå på automasjon og kapasitet på redundans. Økt inflasjon innen spesielt kraft/elektro-fagene. Dette gir en investeringsøkning for prosjektet på om lag 200 MNOK. I midten av oktober styrket selskapet sin finansiering med 300 MNOK gjennom leasing (100 MNOK) og rettet emisjon (200 MNOK). Dette dekker den økte investeringen, styrker arbeidskapitalen og etablerer en kapitalbuffer.

Økt finansiering vil dekke kapitalbehovet for å ferdigstille utbyggingen samt behovet for arbeidskapital fram til full produksjon.



DET ØKTE KAPITALBEHOVET ER FINANSIERT SLIK:

Økt leasingramme:	100 MNOK
Ny egenkapital fra Gigante Havbruk AS¹:	100 MNOK
Ny egenkapital fra andre investorer¹:	100 MNOK
Totalt	300 MNOK

¹Gjennomført rettet emisjon 11. oktober 2023.

Økte investeringskostnader:	200 MNOK
Arbeidskapital:	50 MNOK
Generelle selskapsformål og buffer:	50 MNOK
Totalt	300 MNOK



Prosjektgjennomføring

Ved balansedato gjenstår ca. 6 uker til første del av anlegget skal motta smolt. Det har tidligere blitt kommunisert leveranse av smolt mot slutten av september, men denne milepælen er revidert.

Bakgrunnen for dette er uforutsette negative påvirkninger på installasjonsplanen, herunder værmessige utfordringer under frakt, transport og installasjon av stigerør (sjøside) samt andre praktiske utfordringer under installasjonsarbeidet på teknisk område.

Det er ingen fleksibilitet i installasjonsplanen for de gjenstående aktivitetene, prosjektgjennomføringen videre er derfor prisgitt godt vær, forventningsrett planlegging av aktiviteter og varighet på disse.

Det er ikke meldt om kritiske forsinkelser i material- eller utstyrsleveranser, for levering på anleggsområdet eller andre steder for tilvirkning og fabrikasjon. De mest kritiske aktivitetene i installasjonsplanen er tilstrekkelig ferdigstillelse av teknisk område slik at elektro-arbeider, herunder legging av trekkerør, trekking av kabler, oppkoblinger og testing, kan gå som planlagt. I tillegg til dette er det kritisk å få sammenstilt 3 stigerør på sjøsiden, 3 landrør og videre til lengdestrømskar 8, 9 og 10 i produksjonsbasseng 3.

Prosjektet må være realistisk og forberedt på at det kan oppstå situasjoner og hendelser som potensielt kan påvirke framdriften.

Det som gjenstår av detaljprosjekteringsarbeid gjelder i hovedsak avklaringer rundt planlagte aktiviteter mot driftsfasen, som ikke i vesentlig grad vil påvirke revidert dato for produksjonsstart. Løsning for landstrøm for fase I via sjøkabel fra Rødøy til Lille Indre Rosøy er ferdigstilt, og muliggjør testing av øvrig prosessutstyr, SAT-tester og igangkjøring av anleggets fase I.

Det pågår avsluttende aktiviteter innad i produksjonsbasseng 3, herunder installasjon av PE-liner, PVC-duk og gangbaner med føringsveier for elektro og automasjon som må være klart før oppstart.

Rekrutteringsprosessen for driftsorganisasjonen er avsluttet – alle posisjoner er besatt for den planlagte driftsmodellen, og arbeidet med driftsforberedelser er startet.

I parallell pågår det planlegging av utbyggings fase II, ferdigstillelse av produksjonsbasseng 1 og 2 samt andre aktiviteter for endelig ferdigstillelse. Hovedregelen for engasjement av entreprenører for videre arbeider er å realisere opsjoner i kontraktene for videre engasjement.

Som meldt 7. september er investeringsrammen for utbyggingen oppdatert med en økning på om

lag 200 MNOK. De tidligere kommuniserte bekymringene knyttet til kostnadsøkninger innen el-kraft, samt bevisste valg av løsninger for å bedre og sikre biologi, fiskehelse og velferd, er implementert i den oppdaterte investeringsrammen.

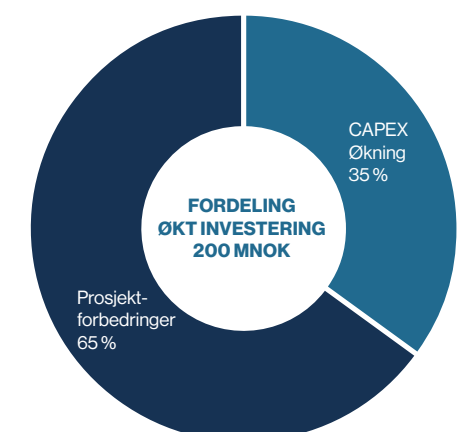
Siden utbyggingsplanene ble lansert i 2021 har det vært prisstigning på alle leveranser. Vi har gjort besparelser og kutt slik at den vesentlige endringen er knyttet til elektro/energi, ca. 1/3 av den økte investeringsprognosen på 200 MNOK. Spesielt etablering av landstrøm har hatt en vesentlig prisøkning de siste

årene, og vi investerer ca. 40 MNOK mer enn opprinnelig budsjettert for å sikre tilgang til fornybar energi. Kapasiteten på landstrøm er også økt med 1,5 MW sammenlignet med opprinnelig plan, dette alene gir en kostnadsøkning på 14 MNOK. Investeringen sikrer tilstrekkelig tilgang til landstrøm også ved produksjonstoppene i full produksjon. Tilsvarende har elektro generelt blitt vesentlig dyrere gjennom utbyggingsperioden. Innen automasjon er det tatt bevisste valg for å styrke driftssikkerheten.

De resterende 2/3 økte investeringer er aktive valg tatt for å bygge et bedre anlegg med økt driftssikkerhet, bedre fiskehelse og velferd. Den største merkostnaden er knyttet til valget om betong på vegger og gulv, som gir et godt underlag for kledning med PE-liner, som sammen gir glatte, solide flater.

Det er også investert om lag 30 MNOK i sjøfylling, som gir økt areal, og mulighet for ytterligere rensing av utslipp og slambehandling. Vi legger også til rette for senere installasjon av turbiner for energigjenvinning.

Selskapet mener at den økte investeringen gir et bedre oppdrettsanlegg med sterkt fokus på driftssikkerhet, biosikkerhet og fiskevelferd.



Operasjonell gjennomgang

Framdriften for produksjonsbasseng 3 er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Alle betongkonstruksjoner til vegger, fundamenter, søyler, gulv og avløpskanaler til produksjonsbasseng 3 er nå ferdig.

Samtlige søyler i produksjonsbasseng 3 er nå kledd med PE-rør, installasjonen av PE-liner på vegg og gulv nærmer seg ferdig, mens PVC-kledning for midtvegger og skille mellom lengdestrømskar startes medio oktober. Samtlige prioriterte gangbaner i produksjonsbasseng 3 er på plass, men det gjenstår å installere gangbanene på langsiden.

Siste del av installasjonsarbeidet for GRP-rørene mot stigerør (sjøside) og inn til lengdestrømskar ferdigstilles mot slutten av oktober. Det etterfylles fortløpende med masser på teknisk område for legging av trekkerør for elektro og automasjon. Det vil fortløpende trekkes kabler for prosessutstyr. Landstrøm er etablert på Lille Indre Rosøy, slik at planlegging av og utførelse for ferdigstilling og testing av prosessutstyr kan starte.

Etter planen skal inntakspumpene testes før installasjon i stigerørene. Etter testing og installasjon vil pumpene startes forsiktig for å fylle sjøvann i produksjonsbasseng 3. Når vannivået i produksjonsbasseng 3 er nådd maksimalt nivå vil det gjennomføres funksjonstester av avløpskanalene. Avløpskanalene er ferdigstilt, men det gjenstår å installere avløpsrør i sjøfylling øst, som skal korrespondere med våre predefinerte utslippspunkter som regulert i utslippstillatelsen.

Parallelt pågår generell prosjektgjennomføring og forberedelser for første driftsfase. HMS-arbeidet har høy prioritet, og samkjøring mellom byggherre og entreprenør er kontinuerlig under arbeid både i prosjektgjennomføringsfase, driftsfase og forberedelser til fase II; prosjektgjennomføring og drift som parallelle hovedaktiviteter. Det gjennomføres vernerunde i gjennomsnitt

hver 2. uke, samt daglige byggemøter for å ivareta kommunikasjon og samhandling mellom byggherre og utførende entreprenører.

Det er i kvartalet gjort en gjennomgang og oppdatering av produksjonskostnadene som viser en beregnet produksjonskostnad på 60 kroner per kilo produsert laks i første fase. I regnestykket inngår finanskostnader.

Den utfordrende råvaresituasjonen de siste årene på grunn av pandemi og krig har gitt økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer, og i hovedsak fiskefôr.

Beregningen legger til grunn 1/3 produksjon, førfaktor på 1,1, og en dødelighet på 10 % fra utsett til slakt. Det er ventet at produksjonskostnadene vil reduseres når anlegget er i full produksjon.



Finansiell gjennomgang

RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2023

Konsernet er fortsatt i en utbyggingsfase, og hadde derfor ingen salgsinntekter i 3. kvartal. Driftskostnader i 3. kvartal ble 652 kNOK, ned fra 707 kNOK i Q3 2022. Driftsresultatet i perioden ble tilsvarende driftskostnadene, -652 kNOK.

Samlet kontantstrøm for konsernet i 3. kvartal var -55 664 kNOK. Differansen fra driftsresultatet skyldes i hovedsak endring i tidsavgrensningsposter. Investeringene gjelder konsernets utbyggingsprosjekt i Rødøy.

Konsernets totale likviditetsbeholdning var per 30.09.23 99 667 kNOK. Gigante Salmon Rødøy har inntestående 50 000 kNOK som er avsatt til driftskapital. Det er i tillegg innvilget 90 000 kNOK i kassakreditt, som driftskapital.

Langsiktig gjeld utgjorde pr. 30.09.23 34,5 % av totalkapitalen. Denne er ventet å øke gjennom den videre utbyggingsperioden.

Langsiktig bankfinansiering for utbyggingen i Gigante Salmon Rødøy, et byggelån på 204 000 kNOK, er innvilget hos Sparebank1 Nord-Norge, og garantert 50 % av Eksfin. Lånet er per 30.09.23 belastet 177 838 kNOK. Etter ferdig-

De samlede investeringene er gjennom Q3 økt til 385 260 kNOK, fra 260 074 kNOK i Q2 2023

stillelse er byggelånet konvertibelt til et nedbetalingslån.

Konsernets finansielle stilling er god, og pr. 30.09.23 kan konsernet betale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest likvide midlene.

Totalkapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 515 879 kNOK, sammenlignet med 286 736 kNOK året før. Egenkapitalandelen pr. 30.09.23 var 280 215 kNOK (54,3 %), sammenlignet med 279 020 kNOK (97,3 %) pr. 30.09.22.

Gigante Salmon meldte 7. september om økning i investeringsprognosen på om lag 200 MNOK. På bakgrunn av dette har selskapet inngått en langsiktig avtale med SpareBank1 Finans Nord-Norge for finansiering av inntil 100 MNOK av økningen. Betingelsene i leasingsavtalen er på linje med vilkårene i selskapets eksisterende, langsiktige gjeldsfinansiering.

Resterende økning i capex er finansiert gjennom en rettet emisjon på 200 MNOK som ble gjort

11. oktober. Nettoprovenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets forventede investeringer og arbeidskapitalbehov for bygging og drift av den landbaserte lakseoppdrett-slokaliteten på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, samt til generelle selskapsformål. Aksjene i den rettede emisjonen vil bli tildelt i to transjer. Første transje på ti millioner aksjer vil bli levert rundt 13. november, mens resterende aksjer i transje to er betinget av godkjenning fra ekstraordinær generalforsamling 31. oktober.

Emisjonen ble fulltegnet og gjort til aksjekurs 7,20 kroner. Selskapet har intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon med inntil 2,78 millioner aksjer til samme kurs som i den rettede emisjonen.

Fullstendig resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter på kommende sider. Styrket finansiering er kun reflektert i note, og vil først framkomme i kommende perioderapporteringer.




A large ship with two cranes is lifting a large black pipe into the water. The ship is white with a blue hull. The cranes are red and blue. The pipe is black and is being lifted by orange slings. The background shows a blue sky with white clouds and a rocky shoreline.

Uttalelse fra styret og adm. dir.


Styret og adm. dir. bekrefter at det konsoliderte regnskapet for perioden 01.07.23-30.09.23 er utarbeidet i henhold til god norsk regnskapsskikk, og gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler, forpliktelser, finansielle status, inntekter og kostnader som helhet. Vi bekrefter også at kvartalsrapporten inkluderer en rettvise oppsummering av selskapets viktigste hendelser frem til resultatfremleggelsen.

Bodø

24.10.2023

A handwritten signature in black ink, reading "Eirik Sørgeard".


Eirik Sørgeard
Styreleder

A handwritten signature in black ink, reading "Helge E. W. Albertsen".


Helge E. W. Albertsen
Adm. dir.

A handwritten signature in black ink, reading "Kristin Ingebrigtsen".

Kristin Ingebrigtsen
Styremedlem

A handwritten signature in black ink, reading "Liv Monica Stubholt".

Liv Monica Stubholt
Styremedlem

A handwritten signature in black ink, reading "Kjell Lorentsen".

Kjell Lorentsen
Styremedlem

Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

GIGANTE SALMON AS - KONSERN

Resultatregnskap

(Beløp i kNOK)

				Konsern		
Resultatregnskap	Note	3. kv. 2023	YTD 2023	3. kv. 2022	YTD 2022	2022
Annen driftsinntekt		-	168	128	128	151
Sum driftsinntekter		-	168	128	128	151
Lønnskostnad		372	1082	80	534	359
Avskrivning	1	25	75	24	72	96
Andre driftskostnader		255	1836	604	2 239	3 408
Sum driftskostnad		652	2 993	707	2 844	3 864
Driftsresultat		-652	-2 825	-579	-2 716	-3 712
Andre renteinntekter		1577	4 197	1497	3 033	4 662
Annen finansinntekt		23	26	-	-	-
Andre rentekostnader		-	46	-	29	29
Annen finanskostnad		-	12	0	2	4
Børskostnader		237	625	-	-	-
Netto finans		1363	3 540	1497	3 002	4 629
Resultat før skattekostnad		711	715	917	286	917
Skattekostnad		148	202	-4 713	-4 613	-4 667
Periodens resultat	2	563	513	5 631	4 900	5 584
Herav til minoritetsinteresser						-
Periodens resultat til majoritetsinteressene		563	513	5 631	4 900	5 584
Disponering			-		-	
Overført til/fra egenkapital		563	513	5 631	4 900	5 584

Kontantstrømoppstilling

(Beløp i kNOK)

Konsern					
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	3. kv. 2023	YTD 2023	3. kv. 2022	YTD 2022	2022
Resultat før skattekostnad	711	715	917	286	917
Tilbakebetalt skatt	-	-	-	-	2 429
Avskrivninger	25	75	24	72	96
Endring i kundefordringer	35	-194	-63	-53	-350
Endring i leverandørgjeld	-344	131	-125	-1 201	-1 636
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1 063	8 143	2 729	4 634	-12 349
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-636	8 871	3 482	3 738	-10 893
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter					
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-93 312	-263 508	-18 770	-57 349	-65 714
Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs)	8 090	-5 532	-2 091	-6 577	-
Utbetalinger ved kjøp av aksjer	-	-100	-	-	-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-85 222	-269 140	-20 862	-63 926	-65 714
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-114 515	-183 900	-16 577	-39 665	-65 714
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter					
Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.)	30 194	177 838	-	-	-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	30 194	177 838	-	-	-
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	-55 664	-82 431	-17 379	-60 188	-76 607
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	155 331	182 097	215 895	258 704	258 704
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	99 667	99 667	198 516	198 516	182 097
Denne består av: Bankinnskudd m.v.	99 667	99 667	198 516	198 516	182 097

Balanse

(Beløp i kNOK)

Konsern				
Eiendeler	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Utsatt skattefordel		5 876	6 025	6 078
Sum immaterielle eiendeler		5 876	6 025	6 078
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		384 535	65 327	108 981
Skip		709	798	776
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		16	12	24
Sum varige driftsmidler	1	385 260	66 137	109 781
Investeringer i aksjer		100	0	-
Sum finansielle anleggsmidler		100	0	-
Sum anleggsmidler		391 236	72 162	115 859
Kundefordringer		-	63	350
Andre fordringer		24 976	15 995	19 285
Sum fordringer		24 976	16 058	19 635
Bankinnskudd, kontanter o.l.		99 667	198 516	182 097
Sum omløpsmidler		124 643	214 574	201 733
Sum eiendeler		515 879	286 736	317 592

Balanse

(Beløp i kNOK)

Konsern				
Egenkapital og gjeld	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Aksjekapital	3	105 556	105 556	105 556
Overkurs		165 734	165 734	165 734
Annen innskutt egenkapital		-	114	114
Sum innskutt egenkapital	2	271 290	271 404	271 404
Annen egenkapital		8 925	7 616	8 299
Sum opptjent egenkapital	2	8 925	7 616	8 299
Minoritetsinteresser		-	-	-
SUM EGENKAPITAL	2	280 215	279 020	279 704
Byggelån		177 838	-	-
Sum annen langsiktig gjeld		177 838	-	-
Leverandørgjeld		48 991	2 201	37 069
Skyldige offentlige avgifter		558	280	189
Annen kortsiktig gjeld		8 277	5 235	630
Sum kortsiktig gjeld		57 826	7 716	37 888
Sum gjeld		235 664	7 716	37 888
Sum egenkapital og gjeld		515 879	286 736	317 592

Noter

REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er tilpasset Euronext Growth Oslo regelbok del II, implementert 1. oktober 2023. Gigante Salmon følger god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Tallene i kvartalsregnskapet er ureviderte.

NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Skip	Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	Sum
Anskaffelseskost 30.06.23	259 325	895	33	260 253
Akkumulerte avskrivninger 30.06.23	-	163	15	178
Balanseført verdi 30.06.23	259 325	732	18	260 075
Tilgang*	125 210	-	-	125 210
Anskaffelseskost 30.09.23	384 535	895	33	385 463
Akkumulerte avskrivninger 30.09.23	-	185	18	203
Balanseført verdi 30.09.23	384 535	709	16	385 260
Avskrivninger i 3. kv. 2023	-	22	3	25

Konsernet eier to øyer som ikke avskrives.

Gigante Salmon er i byggefase for sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Dette forklarer de nye aktiveringe-
ne på varige driftsmidler.

ENDRING I AVSKRIVNINGSPLAN

Det er ingen endringer i avskrivningsplaner.

*Det er aktivert eget arbeid med kNOK 1 556.

NOTE 2 - EGENKAPITAL

Periodens endring i egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.22	105 556	165 734	114	8 299	279 704
Resultat 1. kvartal	-	-	-	55	55
Egenkapital 31.03.23	105 556	165 734	114	8 354	279 759
Resultat 2. kvartal	-	-	-	-105	-105
Egenkapital 30.06.23	105 556	165 734	114	8 249	279 653
Resultat 3. kvartal	-	-	-114	677	563
Egenkapital 30.09.23	105 556	165 734	0	8 926	280 215

RETTET EMISJON:

Gigante Salmon gjennomførte en emisjon den 11.10.2023. Antall aksjer 27,777,777 med pris 7,2 NOK, som gir et emisjonsbeløp på ca. 200 MNOK.

Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere selskapets forventede investeringer og arbeidskapitalbehov for bygging og drift av oppdretts-anlegget på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, samt til generelle selskapsformål.

For ytterligere informasjon:

<https://newsweb.oslobors.no/message/601218>

NOTE 3 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen utgjør kNOK 10 556 og består av 105 556 037 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje.

Styret i Gigante Salmon AS har fullmakt til å øke aksjekapitalen på kNOK 10 000, tilsvarende 10 millioner nye aksjer, gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. Fullmakten ble gitt på ordinær generalforsamling i 2022 med en varighet til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 1. mai 2024.

OVERSIKT OVER DE 20 STØRSTE AKSJONÆRENE PR. 30.09.2023:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Gigante Havbruk AS	54 238 000	51,38 %
Kapnord AS	17 272 728	16,36 %
Helgeland Invest AS	2 727 272	2,58 %
Torghatten Aqua AS	2 727 272	2,58 %
Yannick AS	2 052 500	1,94 %
J.p. Morgan SE	1 794 038	1,70 %
Olav Olsen Holding AS	1 500 000	1,42 %
Iha Invest AS	1 455 000	1,38 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	1 221 883	1,16 %
Kulta Invest AS	1 200 000	1,14 %
Commuter 2 AS	1 090 909	1,03 %
Ravi Investering AS	940 000	0,89 %
Joe Invest AS	929 163	0,88 %
Limt AS	910 000	0,86 %
Nyhamn AS	909 091	0,86 %
Oxvold Invest AS	784 516	0,74 %
Dnor AS	714 387	0,68 %
Ubs Switzerland AS	680 737	0,64 %
Maria Olaisen AS	545 455	0,52 %
Hausta Vekst AS	545 454	0,52 %
Øvrige	11 317 632	10,72 %
Sum	105 556 037	100,0 %

AKSJER EID AV LEDELSE OG NÆRSTÅENDE TIL DISSE

Navn	Rolle	Antall aksjer	Eierandel
Helge E. W. Albertsen	CEO	200 000	0,19 %
Rune Johansen	CFO	310 000	0,29 %
Linda Storholm	CCO	15 500	0,01 %
Eirik Sørgård	Styreleder	200 000	0,19 %
Kristin Ingebrigtsen	Styremedlem	15 000	0,01 %

Eirik Sørgårds 200 000 aksjer eies via heleid selskap Pronord AS.

Rune Johansens 310 000 aksjer eies 35 000 på privat hånd og 275 000 via heleid selskap Nord-Norsk Eiendom AS.

Styremedlem Kjell Lorentsen har bestemmende innflytelse gjennom Gigante Havbruk AS som eier 54 238 000 aksjer (eierandel 51,38%)

og Kapnord AS som eier 17 272 728 aksjer (16,36%). Til sammen kontroller Kjell Lorentsen 67,75% av aksjene.

NOTE 4 - OVERSIKT NÆRSTÅENDE PARTER OG TILKNYTNINGER

	Nærstående part	Tilknytning
a)	Gigante Havbruk AS	Eier Gigante Salmon 51,4%
b)	KapNord AS	Gigante Havbruk eier 51%
c)	Polarplast AS	Gigante Havbruk eier 40%
d)	Gildeskål Forskningsstasjon AS	Gigante Havbruk eier 100%
e)	Salten Aqua AS	Gigante Havbruk eier 35%
f)	Salmon Center AS	Gigante Havbruk eier 100%
g)	Fish Farm International AS	Gigante Havbruk eier 100%

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER REF. LISTEN OVER

	Beløp	Gjelder
a)	134	Innleie av stedfortredende CFO og kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS landbaserte oppdrettsanlegg
b)	17	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS landbaserte oppdrettsanlegg
c)	17 444	Materialkjøp til lengdestrømskar, samt prosjektering- og sertifiseringsarbeid
d)	236	Kjøp av arbeidstimer i forbindelse med detaljprosjektering av Gigante Salmon Rødøy AS landbaserte oppdrettsanlegg. Innleie av båt.
e)	8	Kjøp av administrasjonstjenester
f)	18	Leie av kontorfasiliteter
g)	737	Leie av MF "Haarek".

Detaljprosjektering er aktivert på linjen tomter, bygninger o.a. fast eiendom.



Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

GIGANTE SALMON AS

Resultatregnskap

(Beløp i kNOK)

Resultatregnskap	Note	3. kv. 2023	YTD 2023	3. kv. 2022	YTD 2022	2022
Annen driftsinntekt		422	1699	869	2 277	3 535
Sum driftsinntekter		422	1699	869	2 277	3 535
Lønnskostnad		829	2 693	796	1 699	3 592
Avskrivning		3	9	2	4	7
Andre driftskostnader		234	1 605	555	1 494	2 767
Sum driftskostnad		1066	4 307	1352	3 197	6 366
Driftsresultat		-644	-2 608	-483	-920	-2 831
Annen renteinntekt		705	2 137	672	487	1 835
Annen rentekostnad		-	23	-	29	29
Annen finanskostnad		-	1	0	1	2
Børskostnader		237	625	-	-	-
Netto finans		468	1 488	672	457	1 804
Resultat før skattekostnad		-176	-1 121	189	-463	-1 027
Skattekostnad		-39	-217	-4 881	-90	-5 131
Periodens resultat		-138	-904	5 070	-373	4 104
Herav til minoritetsinteresser						-
Periodens resultat til majoritetsinteressene		-138	-904	5 070	-371	4 104
Disponering			-		-	
Overført til/fra egenkapital		-138	-904	5 070	-371	4 104



Balanse

(Beløp i kNOK)

Eiendeler	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Utsatt skattefordel		6 894	6 518	6 677
Sum immaterielle eiendeler		6 894	6 518	6 677
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		1 437	1 355	1 343
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		16	12	24
Sum varige driftsmidler		1 452	1 366	1 367
Investeringer i datterselskap		192 100	192 100	192 100
Lån til foretak i samme konsern		65 000		
Investeringer i aksjer og andeler		100	-	-
Sum anleggsmidler		265 546	199 984	200 144
Kundefordringer		188	462	-
Andre fordringer		209	2 749	112
Sum fordringer		397	3 211	112
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 687	75 818	78 494
Sum omløpsmidler		12 083	79 029	78 606
Sum eiendeler		277 630	279 013	278 750

Balanse

(Beløp i kNOK)

Egenkapital og gjeld	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Aksjekapital		105 556	105 556	105 556
Overkurs		165 734	165 734	165 734
Annen innskutt egenkapital		-	114	114
Sum innskutt egenkapital		271 290	271 404	271 404
Annen egenkapital		6 388	6 983	6 388
Udekket tap		-789	-	-
Sum opptjent egenkapital		5 599	6 983	6 388
Minoritetsinteresser		-	-	-
Sum egenkapital		276 889	278 387	277 793
Leverandørgjeld		304	223	355
Skyldige offentlige avgifter		172	200	131
Annen kortsiktig gjeld		265	202	472
Sum kortsiktig gjeld		741	625	958
Sum gjeld		741	625	958
Sum egenkapital og gjeld		277 630	279 013	278 750

Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

GIGANTE SALMON RØDØY AS

Resultatregnskap

(Beløp i kNOK)

Resultatregnskap	Note	3. kv. 2023	YTD 2023	3. kv. 2022	YTD 2022	2022
Annen driftsinntekt		-	140	11	11	11
Sum driftsinntekter		-	140	11	11	11
Avskrivning	1	22	66	22	66	90
Andre driftskostnader		21	231	48	189	641
Sum driftskostnad		44	298	71	256	730
Driftsresultat		-44	-158	-60	-245	-720
Annen renteinntekt		872	2 060	825	1874	2 827
Annen finansinntekt		23	26	-	-	-
Andre rentekostnader		-	23	-	-	0
Annen finanskostnad		-	11	-	-	2
Netto finans		896	2 053	825	1874	2 825
Resultat før skattekostnad		852	1894	765	1628	2 105
Skattekostnad		187	419	168	358	464
Periodens resultat		665	1475	596	1269	1641
Herav til minoritetsinteresser		-	-	-	-	-
Periodens resultat til majoritetsinteressene		665	1475	596	1269	1641
Disponering			-		-	
Overført til/fra egenkapital		665	1475	596	1269	1641

NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Skip	Sum
Anskaffelseskost 30.06.23	258 145	895	259 040
Akkumulerte avskrivninger 30.06.23	-	163	163
Balanseført verdi 30.06.23	258 145	732	258 877
Tilgang*	125 175	-	125 175
Anskaffelseskost 30.09.23	383 320	895	384 215
Akkumulerte avskrivninger 30.09.23	-	185	185
Balanseført verdi 30.09.23	383 320	709	384 029
Avskrivninger i 3. kv. 2023	-	22	22

Konsernet eier to øyer som ikke avskrives.

Gigante Salmon er i byggefase for sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Dette forklarer de nye aktiveringerne på varige driftsmidler.

*Det er aktivert eget arbeid med kNOK 1556.

ENDRING I AVSKRIVNINGSPLAN

Det er ingen endringer i avskrivningsplaner.

Balanse

(Beløp i kNOK)

Eiendeler	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		383 320	65 041	107 800
Skip		709	798	776
Sum varige driftsmidler	1	384 029	65 839	108 576
Sum anleggsmidler		384 029	65 839	108 576
Kundefordringer		-	13	350
Andre fordringer		24 768	13 246	19 236
Sum fordringer		24 768	13 260	19 586
Bankinnskudd, kontanter o.l.		87 980	122 698	103 603
Sum omløpsmidler		112 747	135 958	123 189
Sum eiendeler		496 776	201 796	231 765

Egenkapital og gjeld	Note	3. kv. 2023	3. kv. 2022	2022
Aksjekapital		19 230	19 230	19 230
Overkurs		172 870	172 870	172 870
Sum innskutt egenkapital		192 100	192 100	192 100
Annen egenkapital		3 548	1 701	2 072
Sum opptjent egenkapital		3 548	1 701	2 072
Sum egenkapital		195 648	193 801	194 172
Utsatt skatt		1 018	493	599
Gjeld til kredittinstitusjoner		177 838	-	-
Langsiktig konserngjeld		65 000		
Sum annen langsiktig gjeld		242 838	-	-
Leverandørgjeld		48 875	2 389	36 507
Skyldige offentlige avgifter		386	80	153
Annen kortsiktig gjeld		8 011	5 033	332
Sum kortsiktig gjeld		57 272	7 502	36 993
Sum gjeld		301 128	7 995	37 592
Sum egenkapital og gjeld		496 776	201 796	231 765



**Gigante
Salmon**
